COMUNE DI ANCONA

Direzione Ambiente Verde Pubblico

MANUTENZIONE ORDINARIA

DELLA SPIAGGIA URBANA DEL PASSETTO

APRILE 2021

PROGETTO

Responsabile del Procedimento: arch. Roberto PANARIELLO

Progettista: arch. Roberto PANARIELLO


ROBERTO PAN.
2021.04.28 13:46:26
CN=ROBERTO PANARIEL
C=IT
2.5.4.4=PANARIELLO
2.5.4.42=ROBERTO
RSA/2048 bits

Ente Parco Regionale del Conero Prot.0001296-29/04/2021-eprc-PG-0002-00060009-A 0001-0006



La spiaggia del Passetto come si presenta nella situazione ripristinata in piena estate

Ente Parco Regionale del Conero Prot.0001296-29/04/2021-eprc-PG-0002-00060009-A 0001-0006

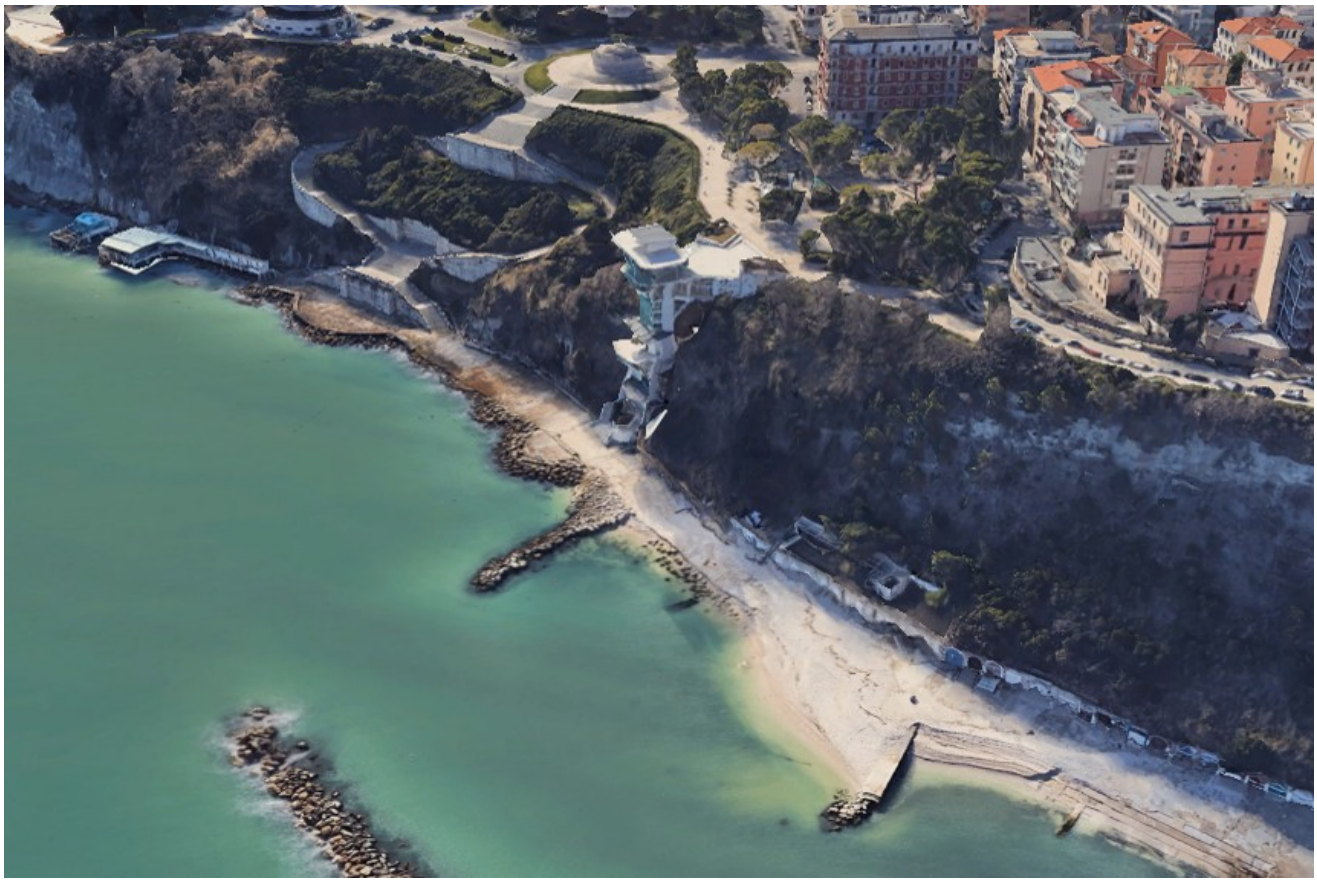

La spiaggia del Passetto nella situazione invernale 2021 con ghiaie accumulate dietro

1. PREMESSE

La presente relazione delinea gli interventi di manutenzione ordinaria da attuarsi nella primavera 2021, in analogia a quanto già realizzato annualmente, dal 2013 in poi, presso la spiaggia urbana del Passetto, dove il susseguirsi delle mareggiate invernali ha provocato fenomeni di accumuli ghiaiosi a depauperamento del tratto di spiaggia compreso tra i due piccoli moli a sinistra dell'ascensore.

In relazione a ciò è necessario reiterare gli interventi realizzati negli anni precedenti dall'Amministrazione Comunale di Ancona, per poter ristabilire la fruibilità della spiaggia pubblica nella stagione balneare.

Allo scopo è stata redatto il presente progetto di intervento sul transetto interessato, all'interno dell'**Unità Fisiografica n. 13** "*Promontorio del Monte Conero*".

Gli interventi da eseguirsi consistono nel **livellamento delle superfici, lo spargimento e la ridistribuzione dei sedimenti**, accumulati dalle mareggiate a ridosso della falesia e delle infrastrutture balneari.

L'intervento si configura quale operazione di ripristino dell'arenile, come definito dall'art. 2,

Ente Parco Regionale del Conero Prot.0001296-29/04/2021-eprc-PG-0002-00060009-A 0001-0006

comma 1 lett. g) del Decreto Ministero Ambiente 15 luglio 2016 n. 173, che recita: "*g) operazioni di ripristino degli arenili: tutte le attivita' che si svolgono nell'ambito di uno stesso sito con ciclicita' stagionale o comunque a seguito di mareggiate che hanno determinato l'accumulo di materiali in una determinata area e consistenti nel livellamento delle superfici, mediante lo spargimento e la ridistribuzione dei sedimenti accumulati in piu' punti dello stesso sito per il ripristino degli arenili che comportano la movimentazione di materiali per quantitativi inferiori a 20 (venti) metri cubi per metro lineare di spiaggia*", nonché "***Operazioni di ripristino degli arenili***" di cui al punto C 1.1.3 della Deliberazione Amministrativa Regione Marche del 6-12-2019, n.104 "*Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC), ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'artricolo 6 della Legge Regionale 14 luglio 2004, n.15*", pubblicata sul B.U.R.Marche del 12-12-2019 Anno L, n.100.

2. INFORMAZIONI GENERALI

Nel PRG vigente l'area dell'intervento ha la seguente destinazione urbanistica:

- Zona Territoriale Omogenea F
- Art. 43 - ZT5 "Viale della Vittoria"
- Art. 84.4 – Falesia

e ricade all'interno del perimetro della Variante Generale al **Piano del Parco del Conero** approvato con le deliberazioni n. 154/2010 e n. 156/2010 del febbraio 2010 della Regione Marche (pubblicata sul supplemento n. 5 del B.U.R. n. 37 del 29 Aprile 2010):

- Ambiti territoriali omogenei: ATN
- Sub ambiti territoriali: N1
- Unità territoriali elementari: UTE_N1a
- Aree progetto strategiche: aps20 - apo6
- Aree omogenee L.394/91: Area di Promozione Economica e Sociale

Sull'area insistono i seguenti vincoli:

- Beni paesaggistici - Zona del Passetto D.M. 1/2/52
- Beni paesaggistici - Promontorio Monte Conero D.M.31/07/85

L'intervento non contrasta con dette norme e destinazioni urbanistiche.
L'intervento ricade all'interno dell'*Unità Fisiografica n.13 - Unità Fisiografica Secondaria UFsec_07* del PGIAC Marche (DACR n. 169 del 2/2/2005) e riguarda una parte del *Transetto n. 363*.

Ente Parco Regionale del Conero Prot.0001296-29/04/2021-eprc-PG-0002-00060009-A 0001-0006

Secondo le definizioni richiamate nel Piano sopracitato, la sub-unità fisiografica della spiaggia del Passetto è identificata come spiaggia metropolitana, fortemente antropizzata, in cui le opere costiere principali in zona Cardeto sono scogliere poste a protezione di collettori fognari (1954-1979) e le opere a corredo delle grotte artificiali al piede delle rupi (anni ’40-’60), oltre ad altre opere murarie a corredo delle quasi 500 grotte che si susseguono per gruppi sempre meno numerosi fino allo scoglio del Trave. Le più vecchie, di inizio ‘800, sono al Passetto dove è presente anche un’ampia piattaforma rigida a servizio delle stesse (anni ’30 e ’60) dotata di scogliere di protezione (anni ’50-’60-’70).



La situazione sopra descritta ha determinato la formazione della spiaggia urbana del Passetto, utilizzata fin da prima degli anni ’30, costituita da una piattaforma rigida in cemento di varia conformazione con scivoli a mare, aggetti e altro, che si estende, ai piedi della falesia, per circa 600 metri dal pennello-scogliera posto a nord fino alla banchina degli stabilimenti balneari a sud dell’ascensore.

Nella primavera del 2006, a seguito di specifica delibera regionale che ha accolto la richiesta di finanziamento presentata nell’ambito di un bando per i progetti di tutela delle dei litorali costieri, è stato realizzato il progetto di rifacimento della spiaggia nell’area compresa fra i due moli sotto

Ente Parco Regionale del Conero Prot.0001296-29/04/2021-eprc-PG-0002-00060009-A 0001-0006

l'ascensore, consistente nella ricostruzione dell'antica spiaggia, presente fino al secondo dopoguerra, costituita da una distesa di ghiaia e ciottoli, solo in seguito sostituiti dal cemento.
Il progetto ha comportato la posa di circa 3.000 mc di ghiaia calcarea di provenienza alloctona (materiale alluvionale da cava di prestito con diametro compreso tra i 15 e i 40 millimetri) che sono stati stesi nella zona compresa fra la scogliera trasversale e il moletto alla sinistra dell'ascensore, prolungando la spiaggia di 15-20 metri.





Ente Parco Regionale del Conero Prot.0001296-29/04/2021-eprc-PG-0002-00060009-A 0001-0006

Le caratteristiche geologiche e morfologiche del tratto in esame, stante la conformazione tipica dell'intero litorale del Passetto, costituito fondamentalmente da una piattaforma rigida di fronte alle grotte, posta in prossimità del piede della falesia, e da scogliere naturali in parte emerse sia a nord che a sud del tratto antropizzato, anch'esse immediatamente a ridosso della falesia, hanno determinato un'evoluzione della dinamica costiera diversificata rispetto a quanto avviene negli altri litorali dell'unità fisiografica in esame.

Infatti l'azione erosiva del mare, data la scarsità di materiale di sedimento presente nel tratto di costa in esame, non ha provocato gli spostamenti longitudinali relativi rispetto ai mari regnanti, né fenomeni di rip-current con perdita secca trasversale dei sedimenti più sottili.

L'erosione si è concentrata sugli elementi rigidi presenti (scogliere emerse e non), provocando fenomeni di dispersione degli elementi di minore dimensione.

La spiaggia emersa di ghiaia e ciottoli ricostruita nell'anno 2006, considerato che i mari prevalenti sono quelli provenienti da nord e da levante, subisce in ogni stagione invernale un consistente spostamento del materiale che la costituisce.

Nella zona sopra-flutto a ridosso della falesia e delle strutture di servizio alla balneazione (locali bagno, guardia medica estiva e locali commerciali) si realizzano consistenti accumuli di materiale ghiaioso.

Dalla documentazione fotografica allegata è possibile individuare gli accumuli di materiale ghiaioso provocati dalle mareggiate nell'ultima stagione invernale.

3. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2021

Gli interventi di ordinaria manutenzione della spiaggia sopra descritta, sono esclusivamente finalizzati alla ordinaria ridistribuzione del materiale accumulatosi a seguito delle mareggiate, riposizionandolo nelle zone di maggiore erosione.

L'intervento è funzionale alla sistemazione della spiaggia ai fini dell'utilizzo balneare per la prossima stagione estiva e sostanzialmente prevede che gli accumuli ghiaiosi sopra descritti vengano ridistribuiti lungo la linea di costa, sul corrispondente tratto di spiaggia emersa e in parte sommersa presente fra i due pennelli a nord del piede dell'ascensore.

Lo spostamento della ghiaia accumulata avverrà con mezzi meccanici (pale gommate tipo bob-cat) in orario diurno, da un'ora dopo l'alba sino ad un'ora prima del tramonto.

I mezzi per la movimentazione della ghiaia verranno trasportati in cantiere via mare.

L'intervento, compatibilmente con le condizioni meteo marine, sarà realizzato entro il bimestre di maggio-giugno 2021.

Verrà utilizzato esclusivamente il materiale presente ***in situ,*** senza apporto di materiali esterni di alcun genere, previa cernita di eventuali materiali estranei portati dal mare come legname, plastiche varie, vetro, ecc. che saranno smaltiti nel rispetto della normativa sui rifiuti D.Lgs. 152/2006.

Si tratta di una attività che si svolgerà quindi nell'ambito dello stesso sito, senza spostamento di materiale in altro transetto, che si configura come relativo a una ciclicità stagionale o comunque a

Ente Parco Regionale del Conero Prot.0001296-29/04/2021-eprc-PG-0002-00060009-A 0001-0006


seguito di mareggiate.

Lo spargimento e ridistribuzione dei sedimenti accumulati comporteranno la movimentazione di materiali per un quantitativo stimato di **638 mc**, come meglio individuato nel progetto.

Considerato che il fronte mare di spiaggia da ricostruire ha una ampiezza di circa 90 metri, l'intervento movimenterà quantitativi per **circa 7,1 metri cubi per metro lineare di spiaggia**.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto MATTM 173/2016, pertanto dette operazioni sono escluse dall'applicazione del *"Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini", di cui al suddetto D.M.*

L'intervento proposto non ricade all'interno di zone di tutela ambientale della Rete Natura 2000, ma considerata la vicinanza dell'intervento alla delimitazione dei siti SIC -Sito di Interesse Comunitario IT5320005 - COSTA TRA ANCONA E PORTONOVO e ZPS -Zona di Protezione Speciale IT5320015 – MONTE CONERO, per una distanza pari a metri 160 circa nel punto più prossimo, viene comunque allegata la scheda descrittiva sintetica prevista dalla DGRM n.23 del 26/01/2015.

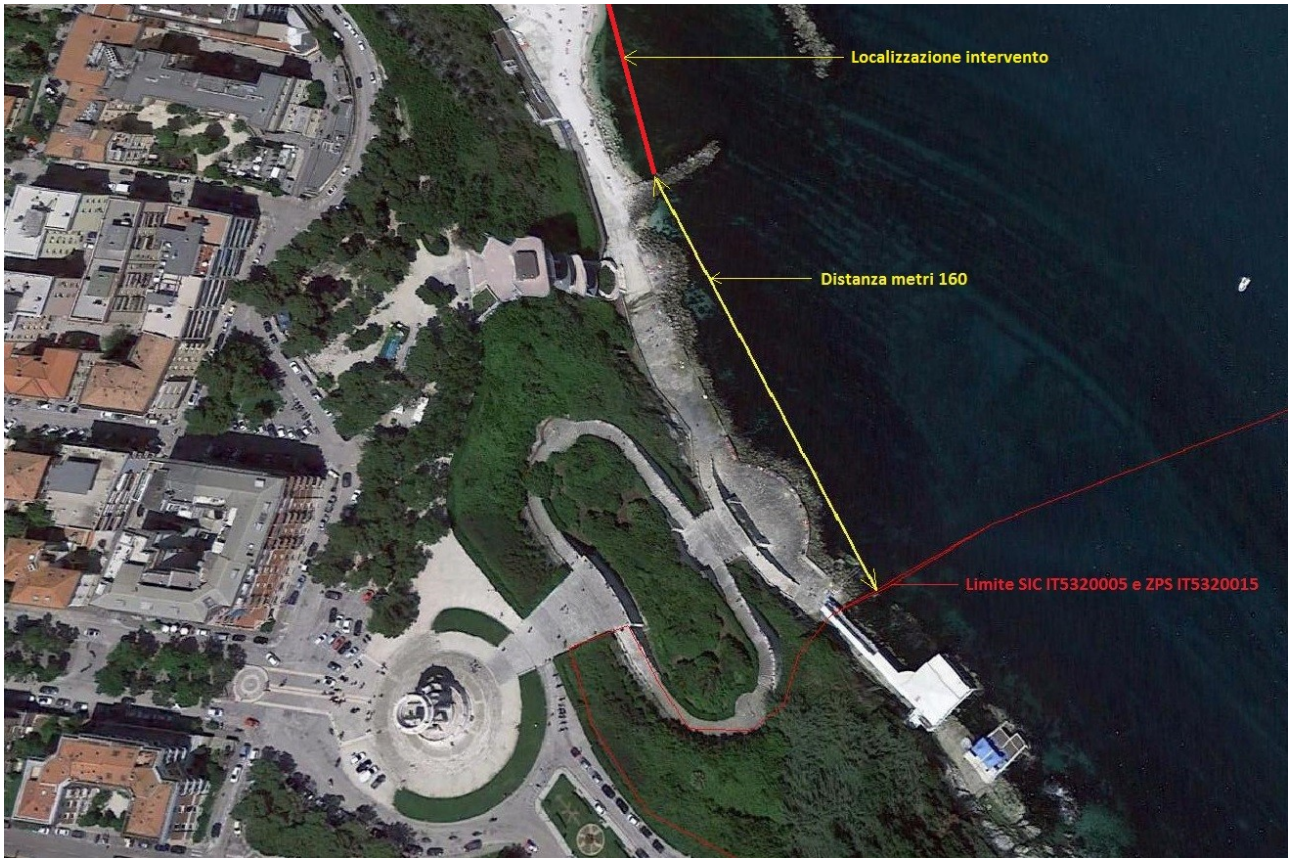

L'intervento di ripristino dell'arenile sarà accompagnato da attività di monitoraggio sulle biocenosi presenti in sito, per lo studio degli eventuali impatti delle movimentazioni effettuate.

Negli interventi realizzati negli anni precedenti non si sono registrati effetti negativi come riportato nelle relazioni fatte appositamente sviluppare, attraverso un attento monitoraggio svolto durante i lavori dal Dipartimento di Scienze dell'Università Politecnica delle Marche.

Ente Parco Regionale del Conero Prot.0001296-29/04/2021-eprc-PG-0002-00060009-A 0001-0006

Le operazioni di stendimento interesseranno la spiaggia emersa evidenziata nella tavola di progetto, fino a ottenere un profilo di spiaggia, per quanto possibile, analogo a quello realizzato nei precedenti interventi di manutenzione.

Non verranno movimentati i sedimenti di spiaggia sommersa e la redistribuzione interesserà la zona intertidale.

Non si sono ad oggi verificati eventi, oltre il fenomeno delle mareggiate, che possono aver determinato una contaminazione dei sedimenti da movimentare. Pertanto l'effetto di torbidità delle acque, causato dallo stendimento nei primi metri di battigia del materiale accumulato, potrà derivare, e in caso in misura limitata, dai soli residui di sabbia e ghiaia fine prodotti dall'erosione che, in acqua, determinano una emulsione lattiginosa, di mera connotazione visiva.

I monitoraggi eseguiti negli anni precedenti non hanno evidenziato effetti negativi sia sulle biocenosi che sulla salute umana.

Al punto di monitoraggio IT011042002006 dell'area di balneazione PASSETTO ASCENSORI, la qualità delle acque per la balneazione risulta di profilo risulta *Eccellente*, come certificato nella specifica scheda dell'ARPAM.

4. CONSIDERAZIONI FINALI e RIEPILOGO DELL'INTERVENTO

L'intervento è reso necessario dalle fasi cicliche di mareggiata verificatesi nell'ultimo inverno e di quelle che verosimilmente potranno ancora verificarsi fino alla tarda primavera.

L'intervento si configura come un ripristino delle condizioni morfologiche preesistenti ai fenomeni di arretramento dovuto all'azione delle mareggiate e:

- non comporta ripercussioni di alcun tipo sul transetto di litorale oggetto dell'intervento e su quelli adiacenti, dato che si limita alla ridistribuzione del materiale già presente;
- interessa una sola parte del transetto n. 363, per una estensione di circa 90 metri fronte mare, rispetto la sua lunghezza totale di metri 177,30;
- non sono previsti effetti negativi sulla biocenosi e sull'equilibrio dell'ecosistema naturale, che comunque saranno sottoposti a monitoraggio ambientale da parte di UnivPM.

Di seguito si riassumono i punti salienti dell'intervento:

<u>INDIVIDUAZIONE NEL PIANO GESTIONE COSTIERA</u>

- Unità fisiografica: n. 13 "Promontorio del monte Conero";
- Unità Fisiografica Secondaria: UFsec_07 ;
- Transetto n. 363 (parte).

<u>INTERVENTO PREVISTO</u>

- ridistribuzione dei sedimenti accumulati in sito con movimentazione di materiali in quantitativo pari a 7,1 mc/ml, inferiore, quindi, a 20 (venti) mc per metro lineare di spiaggia.
- Manutenzione degli elementi presenti nel camminamento di costa con rimozione/sostituzione delle parti danneggiate.

Ente Parco Regionale del Conero Prot.0001296-29/04/2021-eprc-PG-0002-00060009-A 0001-0006

TEMPISTICA

- le attività saranno svolte, in orario diurno da un'ora dopo l'alba sino ad un'ora prima del tramonto, entro il mese di maggio 2021, salvo condizioni meteo marine sfavorevoli.
- Le condizioni di lavorazione risultano legate alle condizioni meteo anche in relazione al trasporto dei mezzi sul posto che potrà essere effettuato solo via mare con l'uso di pontone che imbarca i mezzi al Porto di Ancona, dove li riporterà anche a fine lavori.

ALTRE INFORMAZIONI

- l'intervento è perfettamente analogo a quelli realizzati negli anni dal 2013 in poi;
- verrà rispettata la linea di costa preesistente agli eventi meteo marini causanti gli ammassi di ghiaia;
- tutti gli interventi verranno eseguiti da terra.

Ancona, lì 20 aprile 2021

Il Progettista
Arch. Roberto PANARIELLO

ALLEGATI

1. *Planimetria ed estratto ordinanza con le zone interdette alla balneazione;*
2. *Tavole grafiche di progetto e immagini;*
3. *Calcolo volumi movimento ghiaie;*
4. *Scheda descrittiva sintetica DGRM 23/2015;*

Ente Parco Regionale del Conero Prot.0001296-29/04/2021-eprc-PG-0002-00060009-A 0001-0006

Allegato 1

Prot.Gen. n. 81031 *del* 17/05/2019

COMUNE DI ANCONA

Direzione S.U.I. (Sportello Unico Integrato), Gestione Edilizia Residenziale Privata, Produttiva e Commercio, Patrimonio

Ufficio Patrimonio

N° 41 / 2019

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza Sindacale N. 55 del 17 giugno 2016 di divieto di accesso e stazionamento in quattro tratti di costa individuati nel litorale compreso tra lo "scoglio del Trave" e lo "scoglio della Vela" (limite del territorio comunale in direzione sud-est);

..... OMISSISS .....

ORDINA

1. di considerare le premesse parte integrante della presente ordinanza;

2. **di istituire il divieto di accesso e di stazionamento a qualsiasi titolo nei seguenti tratti di costa individuati anche negli allegati stralci aerofotogrammetrici numeri 1-2-3-4:**

   a) **zona "A"** – tratto compreso tra lo "stabilimento Fincantieri" (escluso) e la grotta n. 7 (esclusa) situata sul litorale con accesso dal sentiero di via Panoramica (c.d. "sentiero della Grotta Azzurra", costa sottostante il Monte Cardeto);

   b) **zona "B"** - tratto compreso tra il costone roccioso laterale alle due grotte isolate poste sul fondo dell'insenatura ubicata a sud-est dell'arrivo in battigia del sentiero proveniente da via Panoramica (c.d. "sentiero della Grotta Azzurra") e la grotta n. 96 (esclusa) situata sul litorale del Passetto a circa 400 metri a nord-ovest dell'ascensore;

   c) **zona "C"** - tratto compreso tra lo stabilimento "ex A.N.M.I." (seconda palafitta ubicata a circa 60 metri a sud-est della scalinata del Passetto) e la grotta n. 104 (esclusa) posta sul litorale sottostante la piscina comunale del Passetto;

   d) **zona "D"** - tratto compreso tra la grotta n. 54 (esclusa) posta sul litorale sottostante la piscina comunale del Passetto e la perpendicolare al mare individuata sulla spiaggia di

..... OMISSISS .....

Si precisa che in caso di inosservanza del presente atto, saranno applicate le norme previste dal Codice Penale per inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall'Autorità.
Il Comando di Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento e di provvedere alla automatica segnalazione alla Autorità Giudiziaria in caso di mancato rispetto.

Dalla residenza Municipale , 17 MAG 2019


IL SINDACO
Avv. Valeria Mancinelli

Ente Parco Regionale del Conero Prot.0001296-29/04/2021-eprc-PG-0002-00060009-A 0001-0006

AREEE INTERDETTE ALLA BALNEAZIONE AL PASSETTO CON AREA INTERVENTO

ALLEGATI ALL'ORDINANZA N.44 /2019


STRALCIO 1: *FINCANTIERI – PIETRALACROCE (in tratteggio le zone interdette)*

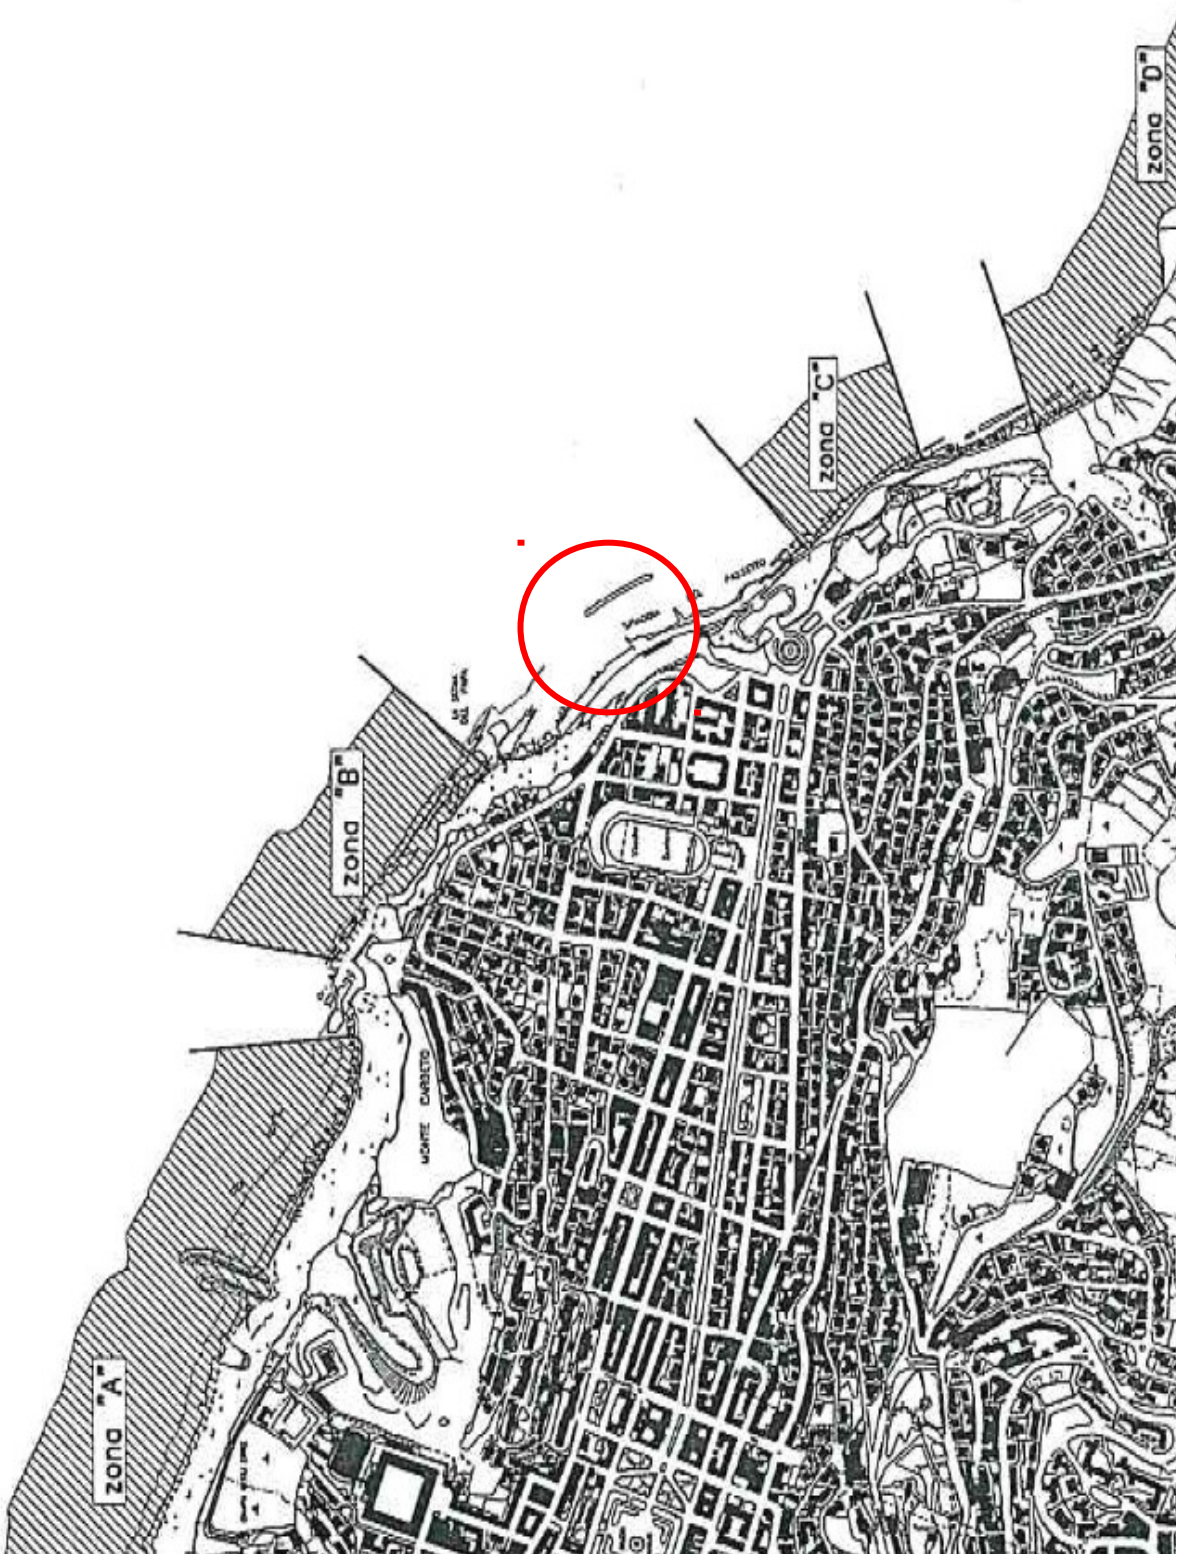

Ente Parco Regionale del Conero Prot.0001296-29/04/2021-eprc-PG-0002-00060009-A 0001-0006

Allegato 2

Stato di fatto al 15-04-2020

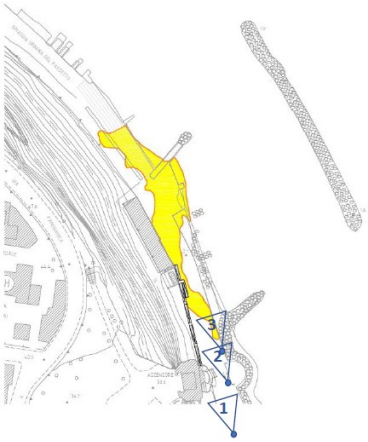









Ente Parco Regionale del Conero Prot.0001296-29/04/2021-eprc-PG-0002-00060009-A 0001-0006

Planimetria Materiale da spostare




Ente Parco Regionale del Conero Prot.0001296-29/04/2021-eprc-PG-0002-00060009-A 0001-0006

Planimetria intervento previsto



Ente Parco Regionale del Conero Prot.0001296-29/04/2021-eprc-PG-0002-00060009-A 0001-0006

Sezioni prima e dopo

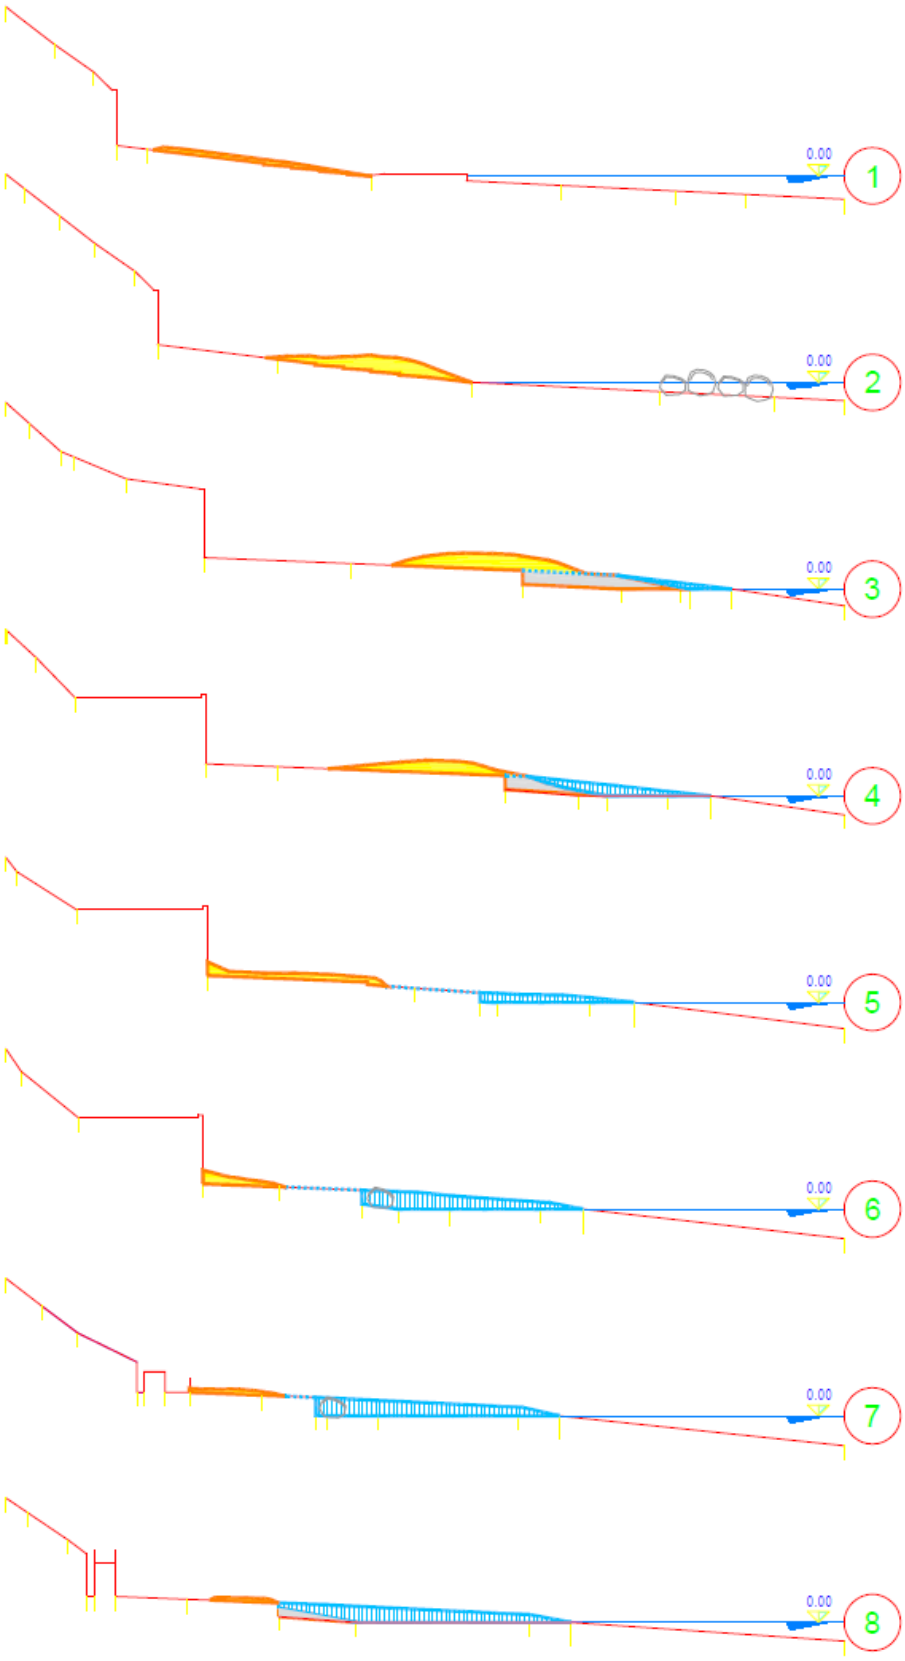

Ente Parco Regionale del Conero Prot.0001296-29/04/2021-eprc-PG-0002-00060009-A 0001-0006






Aree di riposizionamento passerella disabili e punti danneggiati del fondo/percorso da ripristinare







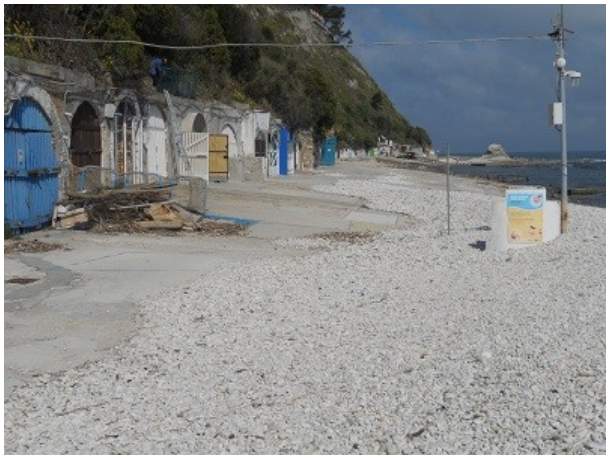

Elementi da rimuovere e ripristinare

Ente Parco Regionale del Conero Prot.0001296-29/04/2021-eprc-PG-0002-00060009-A 0001-0006

Allegato 3

Calcolo Volumi da movimentare

PASSETTO SPIAGGIA URBANA - CALCOLO VOLUMI								
Accumulo ghiaia da movimentare					Spiaggia in ghiaia da ricostruire			
	area sezione [mq]	Distanze [ml]	Volumi [mc]			area sezione [mq]	Distanze [ml]	Volumi [mc]
Sezione 0	0,00				Sezione 0	0,00		
		4,00	7,82				2,00	0,00
Sezione 1	3,91				Sezione 1	0,00		
		20,85	147,93				20,85	0,00
Sezione 2	10,28				Sezione 2	0,00		
		15,12	163,75				15,12	11,04
Sezione 3	11,38				Sezione 3	1,46		
		11,70	111,56				11,70	42,59
Sezione 4	7,69				Sezione 4	5,82		
		14,22	94,63				14,22	77,57
Sezione 5	5,62				Sezione 5	5,09		
		15,17	64,62				15,17	138,50
Sezione 6	2,90				Sezione 6	13,17		
		18,82	18,16				18,82	145,10
Sezione 7	1,93				Sezione 7	15,42		
		14,10	28,27				14,10	207,41
Sezione 8	1,11				Sezione 8	16,25		
		3,00	1,67				2,00	16,25
Sezione 0	0,00				Sezione 0	0,00		
Totale [mc]			**638**		Totale [mc]			**638**
Superficie [mq]			**1365**		Superficie [mq]			**1367**
H media [m]			0,47		H media [m]			0,47

Ente Parco Regionale del Conero Prot.0001296-29/04/2021-eprc-PG-0002-00060009-A 0001-0006

Allegato 4

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

seduta del 26 GEN 2015
delibera 23

pag. 11

Tav. 9 – Scheda descrittiva sintetica

1) SITO NATURA 2000

SIC/ZSC | I | T | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Denominazione: Costa tra Ancona e Portonovo

ZPS | I | T | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | Denominazione: MONTE CONERO

2) DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Tipologia:

- [ ] Intervento generale
- [ ] Intervento inerente le attività agro-silvo-pastorali
- [ ] Intervento su infrastrutture
- [ ] Intervento di gestione faunistica
- [x] Altro

Descrizione dell'intervento:

Manutenzione ordinaria della spiaggia urbana del Passetto di Ancona per l'avvio della stagione balneare 2019.

Ambito di riferimento (inquadramento territoriale, ubicazione e caratteristiche stazionali):

Arenile - spiaggia del Passetto di Ancona
Zona Territoriale Omogenea F
Art. 43 - ZT5 "Viale della Vittoria"
Art. 84.4 - Falesia
Piano del Parco del Conero:
Ambiti territoriali omogenei: ATN
Sub ambiti territoriali: N1
Unità territoriali elementari: UTE_N1a
Aree progetto strategiche: aps20 - apo6
Aree omogenee L.394/91: Area di Promozione Economica e Sociale
Vincoli:
Beni paesaggistici - Zona del Passetto D.M. 1/2/52
Beni paesaggistici - Promontorio Monte Conero D.M.31/07/85

Ente Parco Regionale del Conero Prot.0001296-29/04/2021-eprc-PG-0002-00060009-A 0001-0006

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

seduta del 26 GEN 2015
delibera 23

pag. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

Caratteristiche dell'intervento (caratteristiche fisiche, fase di cantiere, trasformazioni territoriali):

Spargimento - ridistribuzione dei sedimenti accumulati dalle mareggiate invernali con mezzo meccanico.
Non sono previste fasi di cantiere interferenti con la flora del luogo e non ci saranno trasformazioni territoriali.

3) ANALISI DELL'INTERVENTO IN RELAZIONE AL SITO NATURA 2000

Habitat di interesse comunitario interessati dall'intervento:

L'intervento è localizzato a una distanza di metri 160 circa dal perimetro SIC e ZPS. Gli habitat presenti sono: 1160 - Grandi cale e baie poco profonde / 1170 - Scogliere / 1240 - Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici. Gli habitat non sono interessati dall'intervento.

Perdita di habitat di interesse comunitario [X] No

[ ] Si [ ] Permanente [ ] Temporaneo

Frammentazione di habitat di interesse comunitario [X] No

[ ] Si [ ] Permanente [ ] Temporaneo

Specie interessate dall'intevento:

Nessuna

Ente Parco Regionale del Conero Prot.0001296-29/04/2021-eprc-PG-0002-00060009-A 0001-0006

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

seduta del 26 GEN 2015
delibera 23

pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

Perdita di habitat di specie	[X] No			
	[ ] Si	[ ] Permanente	[ ] Temporaneo	

Frammentazione di habitat di specie	[X] No			
	[ ] Si	[ ] Permanente	[ ] Temporaneo	

4) SINTESI DELLE EVENTUALI INTERFERENZE CON HABITAT E SPECIE E DEGLI EVENTUALI CONTRASTI CON GLI OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE DEL SITO

Non si evidenziano interferenze con habitat e specie, né contrasti con gli obiettivi di conservazione del sito.

5) VALUTAZIONE SINTETICA DEGLI EFFETTI CUMULATIVI DELL'INTERVENTO CON ALTRI PROGETTI NELL'AREA DI INTERESSE

Non ci sono effetti cumulativi dell'intervento con altri progetti nell'area di interesse.

Ente Parco Regionale del Conero Prot.0001296-29/04/2021-eprc-PG-0002-00060009-A 0001-0006

Ente Parco Regionale del Conero Prot.0001296-29/04/2021-eprc-PG-0002-00060009-A 0001-0006
